



Interreg



MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional



ALIEM⁹
APOSTROPHE

LIVRABLE M.2.1 PRODOTTO M.2.1

-

M.2.1 - RAPPORT DE MONITORAGE M.2.1 - RELAZIONE DI MONITORAGGIO



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée

ALIEM'

Action pour limiter les risques de diffusion des espèces introduites envahissantes en Méditerranée « APOSTROPHE »

1^{er} Comité de Pilotage – 1^{mo} Comitato di Pilotaggio

12/07/2022 - Corte

Ordre du jour du comité de pilotage

Ordine del giorno del comitato di pilotaggio

14h : Démarrage du comité de pilotage / **Inizio del comitato di pilotaggio**

15h : Rappel des règles de gestion administrative et financière / **Promemoria delle norme di gestione amministrativa e finanziaria**

15h30 : Présentation des activités techniques / **Presentazione delle attività tecniche**

17h : Fin du comité de pilotage / **Fine del comitato di pilotaggio**

Validation du règlement intérieur par les partenaires

Validazione del regolamento interno da parte dei partner





Fiche contacts du projet / Scheda di contatto del progetto

Contacts du chef de File / Contatti del Capofila

Marie-Cécile RUIZ : Office de l'environnement de la Corse : marie-cecile.ruiz@oec.fr

Marie-Hélène LUCIANI : Office de l'environnement de la Corse : marie-helene.luciani@oec.fr

Albert Boulanger : Assistance Technique : boulanger.albert@cdinnov.com

Pascal Quilici : Assistance Technique : pascal.quilici.cdinnov@gmail.com

Objectifs spécifiques du projet

Obiettivi specifici del progetto



Interreg



MARITTIMO-IT FR-MARITIM

S1

Exploiter les connaissances et les données partagées au niveau transfrontalier : Module de recherche thématique des données pour organiser un dispositif permettant l'édition périodique de bulletins de vigilance et d'alerte sur l'évolution de la situation des territoires. Sfruttare le conoscenze e i dati con il livello transfrontaliero: Modulo di ricerca tematica dei dati per organizzare un dispositivo che consenta l'edizione periodica di bollettini di vigilanza e allerta sull'evoluzione della situazione dei territori.

S2

Consolider et développer le réseau, notamment en milieux insulaires : À travers l'activité de chaque partenaire, les organismes locaux accèdent à la plateforme commune pour recueillir de l'information, pour opérer des signalisations, pour accéder à des formations et participer à l'enrichissement des bases de données. Consolidare e sviluppare la rete, in particolare negli ambienti insulari: Attraverso l'attività di ciascun partner, gli organismi locali accedono alla piattaforma comune per raccogliere informazioni, effettuare segnalazioni, per accedere a corsi di formazione e partecipare all'arricchimento delle banche dati.

S3

Maintenir le plan conjoint transfrontalier à jour : Le Plan Conjoint Transfrontalier sera enrichi, les activités des partenaires seront évalués sur les critères de transférabilité et sur leurs capacités de capitalisation.

Il Piano Congiunto Transfrontaliero sarà arricchito, le attività dei partner saranno valutate in base ai criteri di trasferibilità e alla loro capacità di capitalizzazione.

Répartition budgétaire / Ripartizione del budget



Partenaires	FEDER (Taux de Cofinancement 85%)	Budget Éligible Total
OEC	110 230,04 €	129 682,41 €
CD VAR	38 177,75 €	44 915,00 €
CBNMED	38 250,00 €	45 000,00 €
MUSMED	42 489,12 €	49 987,20 €
ARPAL	76 844,25 €	90 405,00 €
UNISS	76 500,00 €	90 000,00 €
UNIFI	42 497,10 €	49 996,59 €
TOTAL	424 988,27 €	499 986,20 €

Composantes du projet / Componenti del progetto



Interreg



MARITTIMO-IT FR-MARITIM



06/2022

12 mois / 12 mesi


30/06/2023

Gestion & Règles administratives et financières

Gestione & Regole amministrative e finanziarie

Gestion et règles administratives et financières du projet

Gestione e regole amministrative e finanziarie del progetto

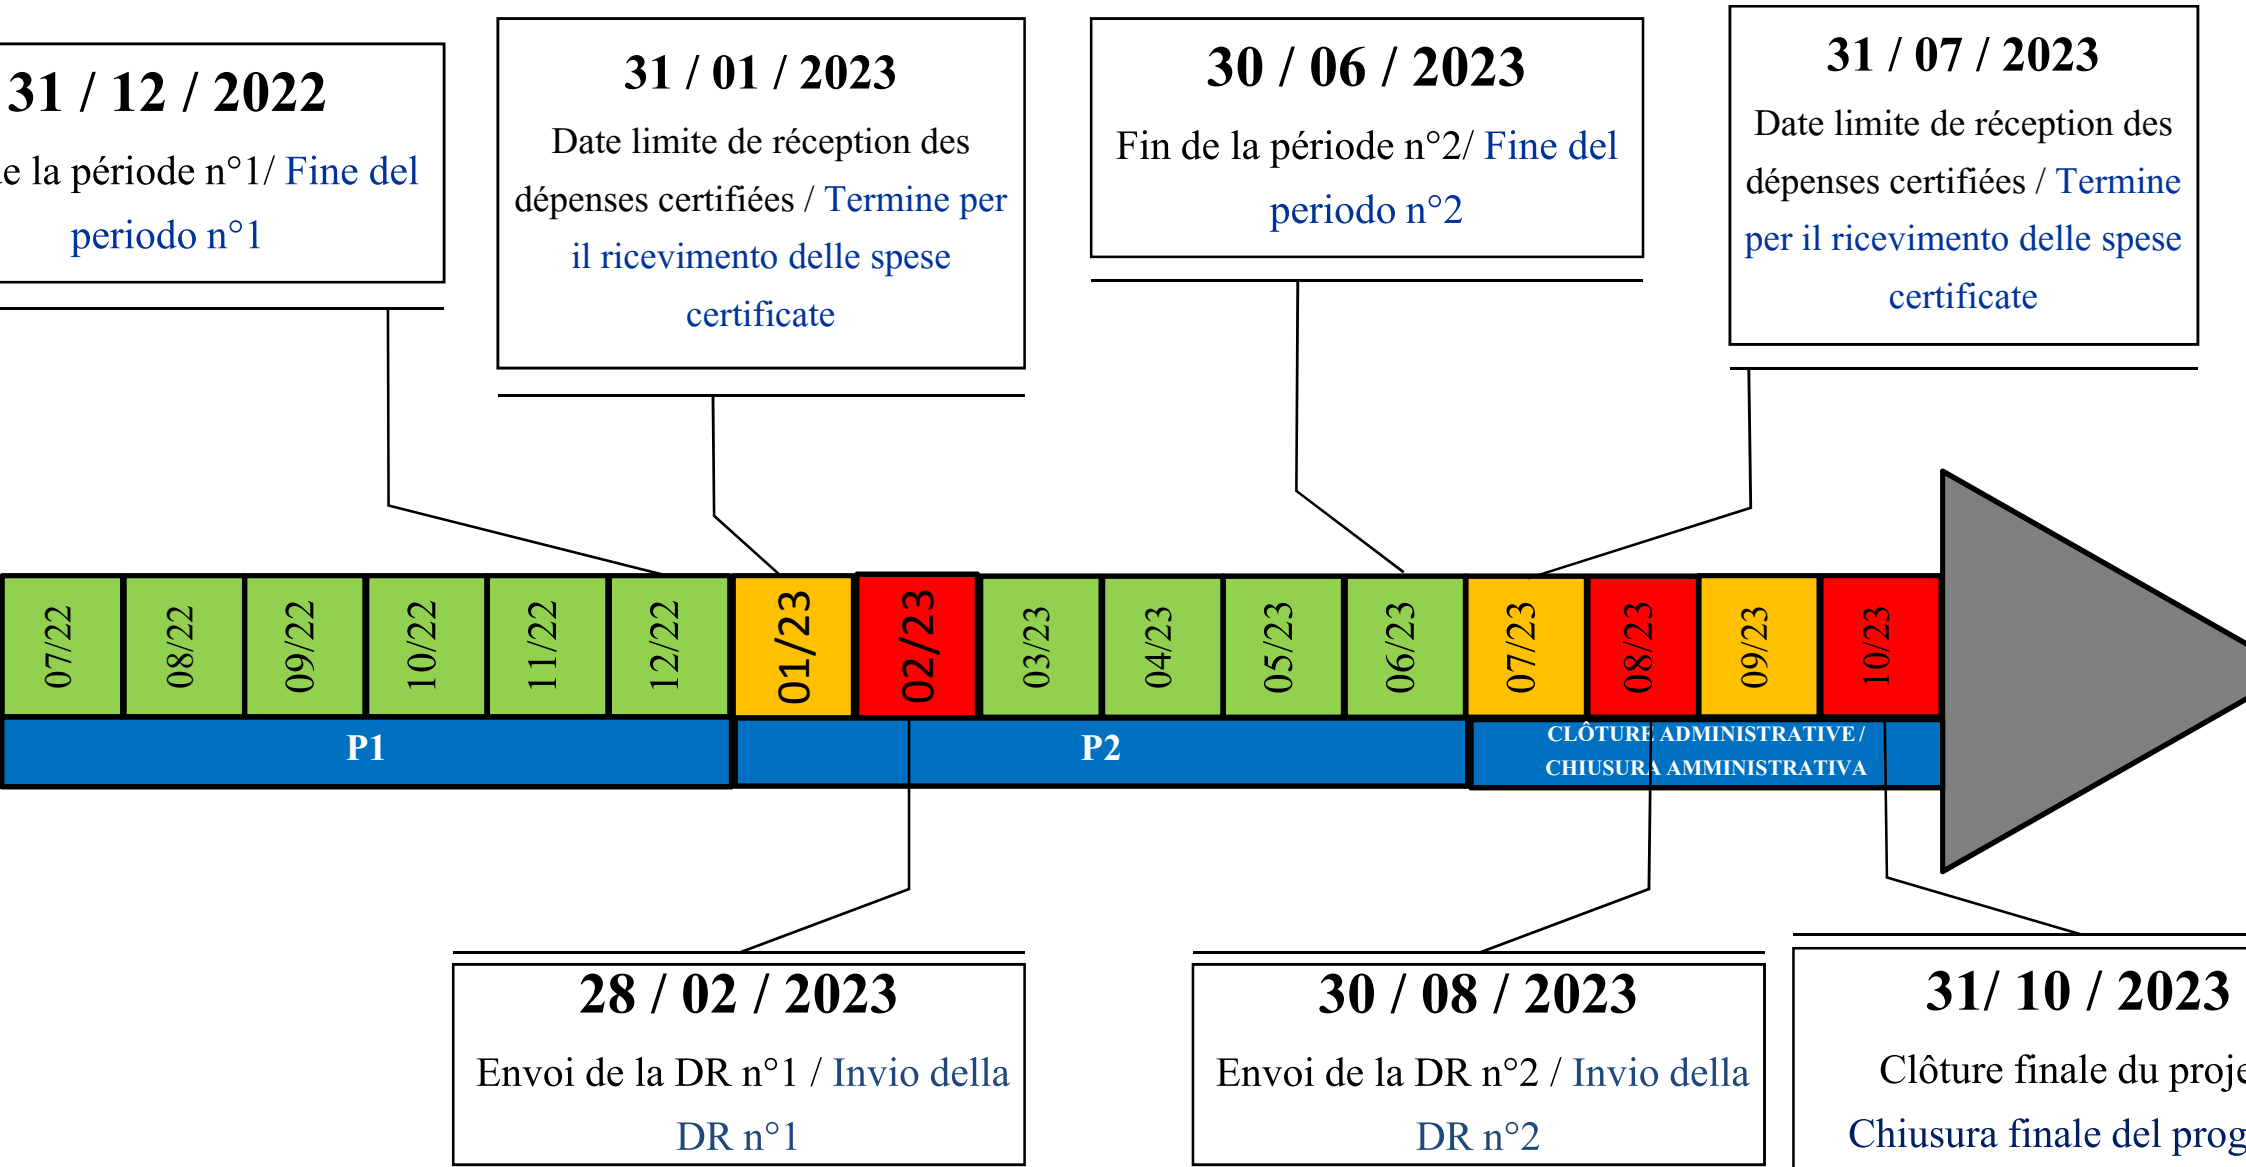

Gestion et règles administratives et financières du projet

Gestione e regole amministrative e finanziarie del progetto

- COMPOSANTE M : Gestion du projet		P01 - OEC	M1	M28	
+ Description de la composante					
- Activité M.1 Pilotage du projet		P01 - OEC	M1	M24	
Description (500 c)	Organisation de la gouvernance du projet avec la constitution d'un comité de pilotage (CdP) auquel tous les partenaires participeront. Il sera doté d'un règlement intérieur qui permettra en se réunissant au minimum 3 fois par an de suivre et prendre les décisions qui s'avèreront nécessaires au fonctionnement du projet. Ce comité pourra également faire l'objet de consultations écrites pour des décisions qui nécessiteront une décision rapide. Le CdP pourra s'adjoindre la participation d'experts.				
+ M.1 Dépenses					
+ M.1 Taches					
- M.1 Produits					
Produit M.1.1 : Rapports des décisions du CdP	Chaque réunion du Comité de Pilotage fera l'objet d'une convocation avec l'ordre du jour, d'un rapport de présentation des points abordés lors de la réunion et d'un procès verbal de décision ou compte-rendu. Un rapport annuel sera présenté comme livrable.		M24	M24	

Gestion et règles administratives et financières du projet

Gestione e regole amministrative e finanziarie del progetto

- Activité M.2 : Monitoring des activités et des dépenses et évaluation de l'engagement		P01 - OEC	M1	M24	
Description (500 c)	Le déroulement des activités et la réalisation des dépenses feront l'objet de contrôles réguliers de manière à éviter qu'un décalage ne se creuse entre partenaires. Un système de suivi en ligne sera effectif. Ce monitoring permettra de réagir à temps, notamment à l'occasion des comités de pilotage pour envisager des solutions concrètes aux problèmes que pourraient rencontrer certains partenaires. Un tableau d'évaluation de l'état des engagements des partenaires sera produit chaque semestre.				
- M.2 Taches					
M.2.2 Rapport de Monitoring 1		Tous les partenaires	M11	M12	
M.2.2 Rapport de Monitoring 2		Tous les partenaires	M23	M24	
M.2.2 Rapport de Monitoring 3		Tous les partenaires	M35	M36	
- M.2 Produits					
Produit M.2.1 : Rapport de monitoring (300 c)	Outre les états de monitoring des activités qui seront réclamés pour l'exécution du projet par le ST ou l'AG, chaque comité de pilotage sera l'occasion d'établir un état de l'avancement des activités et des dépenses. Le suivi en ligne mis en place limitera les écarts.		M24	M24	
Produit M.2.2 : États annuels de l'avancement des engagements et de la qualité des résultats	Un tableau de l'avancement des engagements sera mis en place indiquant les différentes étapes de la passation des marchés et des consultations publiques. Ce tableau fera état de la qualité atteinte dans l'exécution des activités. Ils seront rassemblés dans 2 rapports annuels d'évaluation de la qualité des engagements.		M24	M24	

Gestion et règles administratives et financières du projet

Gestione e regole amministrative e finanziarie del progetto


- Activité M.3 : Comptes-rendus des activités et états financiers		Tous les partenaires	M1	M28	
Description (500 c)	Le Chef de File organise tous les 6 mois, aux dates qui seront communiquées par le ST et l'AG, la production des comptes-rendus individuels des partenaires et consolidés pour le projet. Cette activité s'accompagne d'une assistance mise en place par le Chef de File pour guider les partenaires quant à l'exécution de leurs obligations dans la production de ces comptes-rendus, ainsi que pour la saisie des données et pièces nécessaire dans le cadre du Système de gestion en ligne du programme.				
+ M.3 Dépenses					
- M.3 Taches					
+ M.3.3 Sélection des CIL					
+ M.3.3 Compte rendu 1		Tous les partenaires	M1	M7	
+ M.3.3 Compte rendu 2		Tous les partenaires	M7	M13	
+ M.3.3 Compte rendu 3		Tous les partenaires			

Fin de période
 Fine di periodo


Echéance compte-rendu /
 Data di scadenza del rapporto

Gestion et règles administratives et financières du projet

Gestione e regole amministrative e finanziarie del progetto

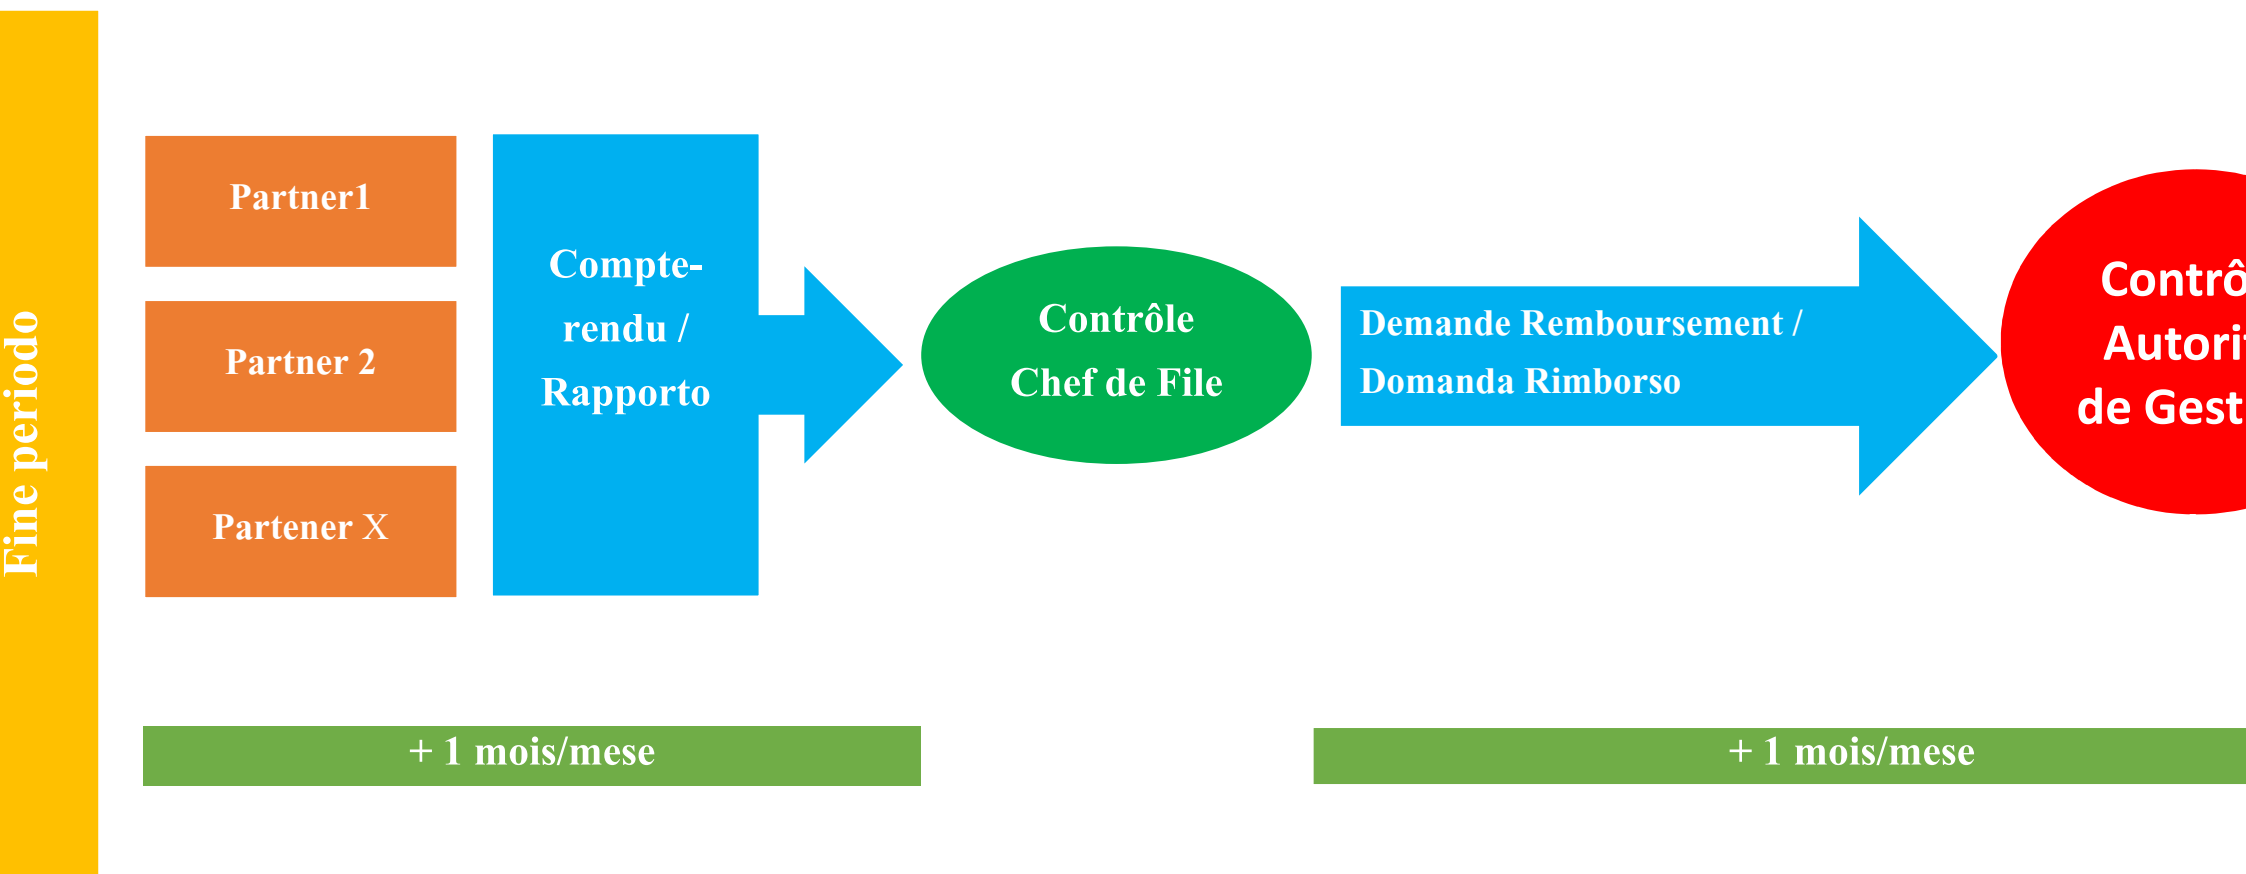


STEP 2

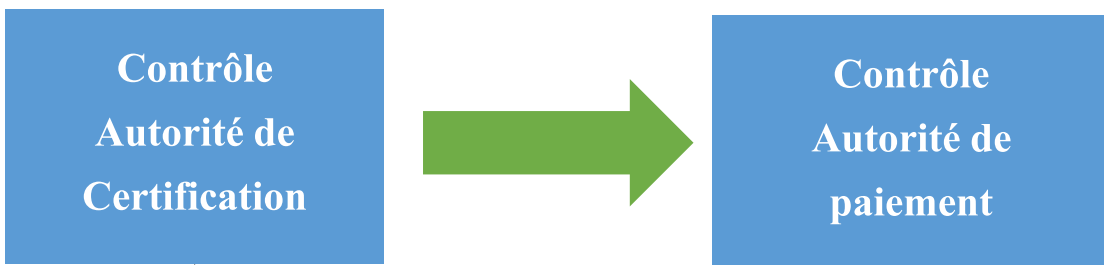

STEP 3



STEP 4

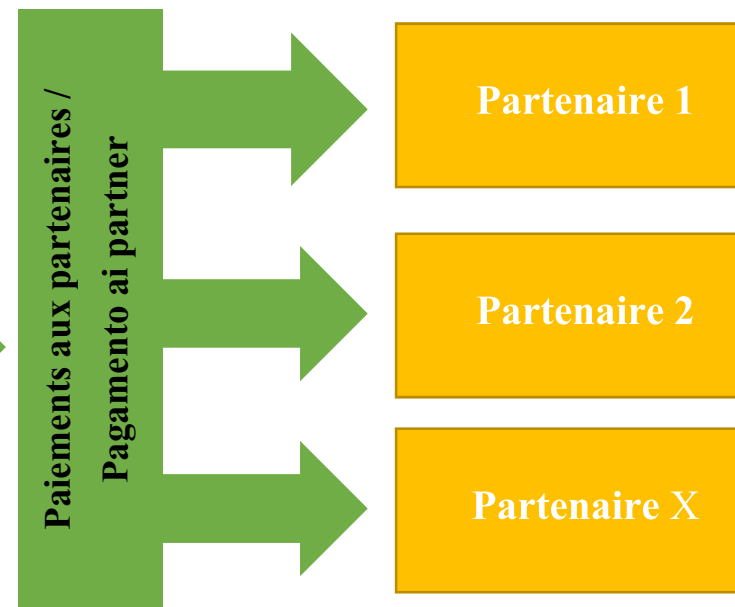

STEP 1

Envoi de la DR à l'AdG*

Chef de File

Transmettre/trasmettere IBAN



Gestion et règles administratives et financières du projet **Gestione e regole amministrative e finanziarie del progetto**

Les comptes-rendus financiers se réalisent après chaque fin de période sur la plateforme Marittimo+ dont les identifiants vous sont ou seront transmis automatiquement par l'Autorité de Gestion.

I rapporti finanziari sono realizzati dopo ogni fine periodo sulla piattaforma marittimo + i cui identificatori verranno automaticamente trasmessi dall'autorità di gestione.

Certification des Dépenses :

Certificazione delle spese :

Partenaires Français : Réalisée par le Pôle Unique de Certification

Partner francesi: realizzati dal Centro di certificazione unico

Partenaires Italiens : Réalisée par un contrôleur externe -> La procédure de sélection doit être engagée

Partner italiani: realizzati da un controller esterno -> La procedura di selezione deve essere avviata

Dégagement d'office / Desimpegno automatico

L'autorité de Gestion pourra engager une procédure de dégagement d'office si la consommation (payée) est inférieure à 80% du budget initialement alloué aux deux premiers semestres (Art.14 de la convention AG- CdF)

L'autorità di gestione potrà avviare d'ufficio una procedura di disimpegno se il consumo (pagato) è inferiore all'80% del bilancio inizialmente stanziato per i primi due semestri (art.14 della convenzione AG-CdF)

Dans le cas où un dégagement d'office aura lieu, celui-ci sera imputé proportionnellement à la différence en pourcentage de budget non dépensé par rapport à l'objectif de dépense prévu du partenaire en retard.

Qualora si verifici un disimpegno automatico, questo sarà imputato proporzionalmente alla differenza in percentuale del bilancio non speso rispetto all'obiettivo di spesa previsto del partner in ritardo.

Gestion et règles administratives et financières du projet Gestione e regole amministrative e finanziarie del progetto

	Budget S1+S2	Objectif / obiettivo 80 %
OEC	129 682,41 €	103 745,93 €
CD VAR	44 915,00 €	35 932,00 €
CBNMED	45 000,00 €	36 000,00 €
MUSMED	49 987,20 €	39 989,76 €
ARPAL	90 405,00 €	72 324,00 €
UNISS	90 000,00 €	72 000,00 €
UNIFI	49 996,59 €	39 997,27 €
TOTAL	499 986,20 €	399 988,96 €

Gestion et règles administratives et financières du projet Gestione e regole amministrative e finanziarie del progetto

Demande du Code CUP

Richiesta per il codice CUP

Seul les partenaires italiens sont concernés par cette procédure : Chaque partenaire Italien doit demander le CUP spécifique à son propre Budget.

Solo i partner italiani sono interessati da questa procedura: ogni partner italiano deve richiedere il CUP specifico per il proprio budget.



Demande d'acompte / Richiesta di anticipo

La demande d'un acompte de 25% de la contribution FEDER s'effectuera à la suite de la signature de la convention, et celle-ci sera versée au CdF par le bénéficiaire à l'ensemble des partenaires. La richiesta di un deposito del 25% del contributo del FESR sarà effettuata dopo la firma dell'accordo di convenzione al CdF, che sarà restituito a tutti i partner

Le moment où le total des dépenses justifiées (FEDER+CN) aura atteint 30% de la contribution FEDER, une partie de l'acompte s'élevant au maximum de la contribution FEDER du projet sera déduite du premier paiement effectué en faveur du projet.

La partie de l'acompte octroyé, s'élevant à 10% de la contribution FEDER du projet sera déduit du solde à verser au projet à la suite de la présentation de la demande finale de remboursement.

Quando la spesa giustificata totale (FESR + CN) raggiunge il 30% del contributo del FESR, una parte dell'anticipo pari al massimo al 15% del contributo del progetto sarà detratta dal primo pagamento effettuato a del progetto.

La parte restante del pagamento anticipato, pari al 10% del contributo FESR del progetto, sarà detratta dal saldo da versare al progetto a seguito della presentazione della richiesta finale di rimborso.

projet utilisera comme appui à sa coordination le **logiciel**

participatif en ligne SMARTSHEET.

progetto utilizzerà il **software collaborativo online SMARTSHEET** per supportare il suo
inamento.



**Sous la même forme qu'un tableur classique, celui-ci permet d'avoir un aperçu global du projet, s
tâches à accomplir et les budgets associés dans les limites temporelles.**

**Nella stessa forma che un foglio di calcolo convenzionale, fornisce una panoramica del progetto, delle attività
eseguire e dei budget associati entro i limiti di tempo.**

**ensemble des partenaires pourront intervenir sur ce logiciel, ce qui permettra d'avoir un suivi en temps
du projet, mais également d'accéder à des documents ou échanger des informations.**

**il partner potranno intervenire su questo software e questo consentirà il monitoraggio in tempo real del
tto, ma anche per accedere ai documenti o scambiare informazioni.**



**Un tableau de bord dynamique en ligne et spécifique à chaque partenaire sera
fourni,**

un dashboard dinamica online e specifica per ciascun partner.

**Un récapitulatif sur le semestre en cours des tâches à venir et un aperçu par
de dépense du budget. Celui-ci sera constamment actualisé.**

**Un riepilogo del semestre in corso le attività imminenti e una panoramica per
di spesa del suo budget. Questo sarà costantemente aggiornato.**

T1

**Consolidation
opérationnelle du
réseau Aliem**

**Consolidamento
operativo della rete
Aliem**



ALIEM
Action pour **L**imiter les risques
de diffusion des espèces **I**ntroduites
Envahissantes en **M**éditerranée

Activités de la composante T1

Attività del componente T1

- OUTPUT : Réseau Aliem consolidé à travers un centre de ressources digital et interactif			M1	M12 <input type="button" value="v"/>	
- OUTPUT (descriptif 500 c)	Le réseau Aliem se consolide à travers la plateforme transfrontalière comprenant deux cercles principaux, les 9 partenaires Aliem et l'ensemble des organismes participant aux actions conduites dans Aliem et Aliem ' en matière de vigilance, signalement, et sensibilisation. Ces membres du réseau bénéficient des informations et interagissent dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les EEE. Le résultat attendu est l'augmentation des interactions visant les objectifs du projet. (490)				
Quantification (nombre)		1			

Activités de la composante T1

Attività del componente T1

	<ul style="list-style-type: none"> Activité T1.1 : Développement du partage transfrontalier des connaissances pour les rendre actives et opérationnelles 		P01 - OEC	M1	M6	
✓	description (500 c)	<p>Activité ciblée sur l'exploitation des connaissances sur les EEE prioritaires et voisines qui constituent des signaux de risques pour la biodiversité des territoires diminuant leur résilience. La généralisation de la méthodologie de repérage/signalement est nécessaire pour améliorer la qualité des observations et leur exploitation. L'investissement dans une suite "signalement, indexation, extractions" est nécessaire pour créer un dispositif de vigilance/alerte face à une menace croissante. (494)</p>				
	+ T1.1 Dépenses					
	+ T1.1 Taches	<p>Chaque partenaire peu indiquer une action qu'il pense pouvoir conduire sur son territoire en coordination avec ses homologues transfrontaliers / ogni partner puo' indicare un attività che pensa possibile sul suo territorio in coordinamento coi collega</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> T1.1 Produits (300 c par livrable) 	<p>fiches de risques par type de sensibilité (facteurs d'introduction) = fiche de vigilance</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> Produit T1.1.1 : Classeur des fiches de risques 	<p>Le produit sera constitué d'un classeur de fiches de risque par type de sensibilité. Ces fiches seront les bases de références pour l'édition de bulletins d'alerte et de vigilance.</p>	P01 - OEC	M8	M8	

Activités de la composante T1

Attività del componente T1

	- Activité T1.2 : Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles		P05 - PROVINCIA LIVORNO	M3	M18
✓	description (500 c)	Les actions de vigilance/sensibilisation des publics cibles seront poursuivies en généralisant à travers la plateforme transfrontalière développée, la numérisation et la digitalisation des outils développés dans Aliem, notamment l'exposition temporaire qui sera transformée en visite virtuelle interactive. Les contenus de formation/sensibilisation des groupes cibles seront traduits sous formats numériques pour développer les actions du réseau de vigilance/éducatif pour les agents intermédiaires. (499)			
	T1.2 Dépenses				
	+ T1.2 Taches	Chaque partenaire peu indiquer une action qu'il pense pouvoir conduire sur son territoire en coordination avec ses homologues transfrontaliers / ogni partner puo' indicare un attività che pensa possibile sul suo territorio in coordinamento coi collega transfrontalieri.			
	- T1.2 Produits (300 c par livrable)				
	Produit T1.2.1 : Visite virtuelle de l'exposition sur les espèces Aliens	Cette visite virtuelle et interactive en ligne comprendra également des contenus audiovisuels selon les technologies de réalité virtuelle. Ce produit traduira l'exposition itinérante conçue dans Aliem, mais dont l'impact a été réduit à cause de la crise.	P05 - PROVINCIA LIVORNO	M4	M7
	Produit T1.2.2 : Jeux dématérialisés en ligne	Les supports ludiques élaborés dans le cadre du projet Aliem seront numérisés pour une accessibilité en ligne y compris pour des sessions pédagogiques.	P01 - OEC	M4	M7
	Produit T1.2.3 : Cours de formation en ligne	La mise en ligne des formations réalisées dans le cadre du projet Aliem	P06 - ARPAL	M4	M7

Activités de la composante T1

Attività del componente T1

	- Activité T1.3 : Développement des formations transfrontalières des acteurs de vigilance		P06 - ARPAL	M12	M18
✓	description (500 c)	Depuis l'Annuaire ALIEM à jour, une sélection déterminera les organismes impliqués dans la surveillance/l'alerte de l'apparition des EEE dans les territoires. Partant des contenus élaborés, il sera proposé l'accès à des formations sur les risques effectifs ou identifiés d'introduction des EEE. Ces formations porteront sur les méthodes d'interventions et de signalement à adopter aux "portes d'entrées" des territoires, notamment pour les îles dont les modalités d'introduction sont			
	- T1.3 Dépenses				
	<i>T1.2.x Dépense</i>				
	+ T1.3 Taches	Chaque partenaire peu indiquer une action qu'il pense pouvoir conduire sur son territoire en coordination avec ses homologues transfrontaliers / ogni partner puo' indicare un attività che pensa possibile sul suo territorio in coordinamento coi collega transfrontalieri.			
	- T1.3 Produits (300 c par livrable)				
✓	Produit T1.3.1 : Convention et protocoles "Types"	Convention et protocoles "types" d'accord pour des intervention de formation des auprès des infrastructures de transports et plateformes de distribution.	P05 - PROVINCIA LIVORNO	M10	M10
	Produit T1.3.2 : Carte des portes d'entrée	Carte dans la plateforme transfrontalière	P06 - ARPAL		
	Produit T1.3.3 : Offre de formation spécifique	des formations ciblées sur les catégories les plus impliquées dans le réseau de surveillance	P06 - ARPAL		

Groupes cibles T1

Gruppi target T1



Organismes publics (40) : Universités, centres de recherches publics, organismes techniques

Organismes privés (150) : Sociaux professionnels (Infrastructures de transports, plateformes logistiques, marchandises, usagers professionnels...)

Others (15 000) : Scolaire et grands public

Livrables à produire en composante T1

Prodotti da produrre nel componente T1

Livrables / Prodotti	Responsable de la formalisation / Responsabile della formalizzazione	Echéance / termine
Classeur des fiches de risques / Classificatore delle schede di rischio	OEC	01/2021
Visite virtuelle de l'exposition sur les espèces Aliens / Tour virtuelle della mostra sulle specie aliene	PROVINCIA DI LIVORNO	03/2021
Jeux dématérialisés en ligne / Giochi digitali on-line	OEC	03/2021
Supports de formation en ligne / Materiali di formazione online	ARPAL	10/2021
Recueil de conventions et protocoles d'accords « tipi » pour des interventions de formation / Raccolta di convenzioni e protocolli d'accord "tipi" per degli interventi di formazione	PROVINCIA DI LIVORNO	03/2021

T2

**Plan d'action conjoint
transfrontalier actif et
opérationnel**

*Piano d'azione
congiunto
transfrontaliero attivo
e operativo*



Activités de la composante T2

Attività del componente T2

<input type="checkbox"/> OUTPUT : Plan d'Action Conjoint Transfrontalier enrichi.					
<input type="checkbox"/> OUTPUT (descriptif 500 c)	<p>Les résultats obtenus en matière d'actions publiques pour cette composante seront directement traduits en nombre d'interventions coordonnées dans le cadre de la mise en œuvre du PACT et en relation directe avec la mise en place du processus de mobilisation des acteurs locaux invités à participer à la mise en système éco-durable ce qui permettra de développer les initiatives pertinentes d'interventions ciblées dans ce contexte. L'enrichissement viendra de l'évaluation transfrontalière des actions.</p>				
Quantification (nombre)			14		

Activités de la composante T2

Attività del componente T2

- COMPOSANTE T2 : Plan d'Action Conjoint Transfrontalier actif et opérationnel		P08 - UNISS	M3	M24
+ Description de la composante				
- Activité T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention			M13	M18
Description (500 c)	Les compétences des différents partenaires seront sollicitées pour la mise en place d'actions pilotes transfrontalières de repérage et de prévention. Ainsi des systèmes de repérage utilisant des techniques et des technologies nouvelles seront mis en œuvre (chromatographie, spectrométrie, drones, piégeages, ...). Les protocoles seront détaillés, les actions et les résultats seront décrits, une évaluation transfrontalière (IT-FR) précisera les critères de transférabilité et de diffusion. (490)			
+ T2.1 Dépenses				
+ T2.1 Taches	Chaque partenaire peu indiquer une action qu'il pense pouvoir conduire sur son territoire en coordination avec ses homologues transfrontaliers / ogni partner puo' indicare un attività che pensa possibile sul suo territorio in coordinamento coi collega transfrontalieri.			
- T2.1 Produits				
Produit T2.1.1 : Catalogue des actions pilotes transfrontalières de repérage et de prévention	Le catalogue sera composé de fiches descriptives des actions pilotes transfrontalières de repérage et de prévention conduites, des résultats obtenus et des évaluations transfrontalières réalisées. Ces fiches illustreront les actions composant le Plan Conjoint Transfrontalier.	P07 - UNISS		

Activités de la composante T2

Attività del componente T2

- COMPOSANTE T2 : Plan d'Action Conjoint Transfrontalier actif et opérationnel			P08 - UNISS	M3	M24
+ Description de la composante					
+ Activité T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention				M13	M18
- Activité T2.2 : Actions pilotes de limitation et de gestion				M18	M25
Description (500 c)	Des actions pilotes transfrontalières de limitation et de gestion seront mise en place. Des systèmes techniques avancés seront utilisées : la radio-téléométrie pour les insectes, l'utilisation de ravageurs phytophages et l'endothérapie pour limiter le développement de certaines espèces végétales infestantes. Les protocoles seront détaillés, les actions et les résultats seront décrits, une évaluation transfrontalière (IT-FR) précisera les critères de transférabilité et de diffusion. (485)				
+ T2.2 Dépenses					
+ T2.2 Taches	Chaque partenaire peu indiquer une action qu'il pense pouvoir conduire sur son territoire en coordination avec ses homologues transfrontaliers / ogni partner puo' indicare un attività che pensa possibile sul suo territorio in coordinamento coi collega transfrontalieri.				
- T2.2 Produits					
Produit T2.2.1 : Catalogue des actions pilotes transfrontalières de limitation et de gestion	Le catalogue sera composé de fiches descriptives des actions pilotes transfrontalières de limitation et de gestion conduites, des résultats obtenus et des évaluations transfrontalières réalisées. Ces fiches illustreront les actions composant le PACT.		P08 - UNISS		

Activités de la composante T2

Attività del componente T2

<input type="checkbox"/> COMPOSANTE T2 : Plan d'Action Conjoint Transfrontalier actif et opérationnel			P08 - UNISS	M3	M24
<input type="checkbox"/> Description de la composante					
<input type="checkbox"/> Activité T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention				M13	M18
<input type="checkbox"/> Activité T2.2 : Actions pilotes de limitation et de gestion				M18	M25
<input type="checkbox"/> Activité T2.3 : Actions pilotes alternatives, curatives ou d'éradication				M25	M30
Description (500 c)	Les techniques curatives et d'éradication concernent surtout les espèces végétales, parfois elles peuvent être envisagées même pour les insectes. L'analyse des résultats est essentielle pour ces types d'action dans la mesure où il s'agit d'actions "offensives" réservées à des situations encore géographiquement limitées. Les protocoles seront détaillés, les actions et les résultats seront décrits, une évaluation transfrontalière (IT-FR) précisera les critères de transférabilité et de diffusion. (498)				
<input type="checkbox"/> T2.3 Dépenses					
<input type="checkbox"/> T2.3 Taches	Chaque partenaire peu indiquer une action qu'il pense pouvoir conduire sur son territoire en coordination avec ses homologues transfrontaliers / ogni partner puo' indicare un attività che pensa possibile sul suo territorio in coordinamento coi collega transfrontalieri.				
<input type="checkbox"/> T2.3 Produits (300 c par livrable)					
Produit T2.3.1 : Catalogue des actions pilotes transfrontalières alternatives, curatives et d'éradication	Le catalogue sera composé de fiches descriptives des actions pilotes transfrontalières alternative, curative ou d'éradication conduites, des résultats obtenus et des évaluations transfrontalières réalisées. Ces fiches illustreront les actions composant le PACT.		P08 - UNISS		

Groupes cibles T2

Gruppi target T2

Organismes publics (40) : Universités, centres de recherches publics, organismes techniques

Enti pubblici (40): Università, centri di ricerca pubblici, organismi tecnici



Organismes publics (25) : Institutionnels du projet ALIEM'

Enti pubblici (25): Istituzioni del progetto ALIEM'

Organismes de droits publics (50) : Associations, groupements citoyens (gestionnaires d'espaces), Museum

Organismi per i diritti pubblici (50): Associazioni, gruppi di cittadini (gestori di spazi), Museum

Livrables à produire en composante T2

Prodotti da produrre nel componente T2

ID	Livrables / Prodotti	Responsable de la formalisation / Responsabile della formalizzazione	Echéancier / termini
1.1	Catalogue des actions pilotes transfrontalières de repérage et de Prévention / <i>Catalogo delle azioni pilota di localizzazione transfrontaliera e di prevenzione</i>	UNISS	06/20
2.1	Catalogue des actions pilotes transfrontalières de limitation et de gestion / <i>Catalogo delle azioni pilota transfrontaliere di limitazione e gestionale</i>	UNISS	06/20
3.1	Catalogue des actions pilotes transfrontalières alternatives, curatives et d'éradication / <i>Catalogo delle azioni pilota alternative transfrontaliere, curative e sradicamento</i>	UNISS	06/20

C

Communication

Comunicazione



Activités de la composante C

Attività del componente C

- COMPOSANTE C : Communication		P05 - PROVINCIA LIVORNO	M1	M36
+ Description de la composante				
- Activité C.1 : Mise à jour des éléments de communication		P01 - OEC	M1	M3
+ Description de l'activité				
+ C.1 Dépenses				
+ C.1 Taches				
- C.1 Produits (300 c par livrable)				
Produit C.1.1 Plan de communication mis à jour	La continuité du plan de communication sera assurée, le document initial sera mis à jour au niveau du calendrier de mise en œuvre et sera enrichi du fait de l'orientation numérique du projet. Événements, publications et animations des RS seront articulés.	P01 - OEC	M2	M2
Produit C.1.2 Charte graphique mise à jour	De même le projet ne modifiera que très partiellement sa charte graphique en adaptant l'identité du projet à sa nouvelle dénomination et son nouveau acronyme. La charte graphique du programme sera respectée dans tous ces éléments.	P01 - OEC	M2	M2
Produit C.1.3 Site Internet Alliem mis à jour	Dans la mesure du possible, le site Internet sur le portail du programme sera mis à jour, mais si cela est nécessaire un nouveau site pourra être élaboré. Dans ce cas des liens seront créés pour avoir une certaine interactivité entre les deux.	P01 - OEC	M3	M3

Activités de la composante C

Attività del componente C

- COMPOSANTE C : Communication			P05 - PROVINCIA LIVORNO	M1	M36
+ Description de la composante					
+ Activité C.1 : Mise à jour des éléments de communication			P01 - OEC	M1	M3
- Activité C.2 : Événements dématérialisés ou en présence			P05 - PROVINCIA LIVORNO	M3	M24
+ Description de l'activité					
+ C.2 Dépenses					
+ C.2 Taches					
- C.2 Produits (300 c par livrable)					
Produit C.2.1 Rapport événement de lancement	Organisé par le Chef de File, l'événement permettra de réaffirmer les base du réseau des partenaires dans le cadre du lancement du projet. L'objectif sera de présenter la méthodologie du projet et de diffuser en direction des cibles institutionnelles.		P01 - OEC	M3	M3
Produit C.2.2 Rapport des événements coordonnés transfrontaliers	Un événement coordonné à l'échelle transfrontalière sera réalisé par région, permettant promotion, capitalisation et pérennisation des activités localisées dans le cadre du projet. Ces événements auront lieu à mi-projet et seront soutenus par ses outils.		P05 - PROVINCIA LIVORNO		
Produit C.2.3 Rapport Événement final	Organisé par le Chef de File, l'événement permettra de présenter les réalisations du projet et ses résultats. Il sera axé sur la diffusion, la transférabilité et la capitalisation des réalisations dans le cadre du réseau de gouvernance digital.		P01 - OEC		

Livrables à produire en composante C

Prodotti da produrre nel componente C

ID	Livrables / Prodotti	Responsable de la formalisation / Responsabile della formalizzazione	Echéances / termini
C.1.1	Plan de communication mis à jour / Piano di comunicazione aggiornato	OEC	09/2022
C.1.2	Charte graphique mis à jour / Carta grafica aggiornata	OEC	09/2022
C.1.3	Site internet Aliem mis à jour / Sito web Aliem aggiornato	OEC	09/2022
C.2.1	Rapport événement de lancement / Relazione evento di lancio	OEC	02/2023
C.2.2	Rapport des événements coordonnés transfrontaliers / Segnalazione di eventi coordinati transfrontalieri	PROVINCIA DI LIVORNO	02/2023
C.2.3	Rapport événement final / Relazione evento finale	OEC	06/2023
C.3.1	Publications, éditions et productions du projet / Pubblicazioni, edizioni e produzioni del progetto	OEC	06/2023
C.4.1	Rapport des actions de sensibilisation et d'information sur le médial social / Relazione sulle azioni di sensibilizzazione e di informazione sull'intermediazione sociale	ARPAL	06/2023



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

BIO
DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA



ALIEM'

Action pour limiter les risques de diffusion des espèces introduites envahissantes en Méditerranée « APOSTROPHE »



ALIEM APOSTROPHE

Action pour limiter les risques de diffusion des espèces introduites envahissantes en Méditerranée « APOSTROPHE »

2nd Comité de pilotage /
2° Comitato di pilotaggio
09/11/2022

CULLETTIVITÀ DI **CORSICA**
COLLECTIVITÉ DE **CORSE**

Uffiziu di l' Ambiente
di a Corsica
Office de l' Environnement
de la Corse





ORDRE DU JOUR

-

ORDINE DEL GIORNO



ALIEM'
APOSTROPHE

-  APPROBATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE
MIS À JOUR / *APPROVAZIONE DELLA CARTA
GRAFICA AGGIORNATA*
-  RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES /
*PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE
SCADENZE*
-  PRÉSENTATION DE L'OUTIL FINANCIER
SMARTSHEET /
*INTRODUZIONE ALLO STRUMENTO
FINANZIARIO SMARTSHEET*
-  ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR
PARTENAIRES /
*STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER
PARTNER*
-  ÉCHANGES ENTRE LES PARTENAIRES /
SCAMBII TRA I PARTNER



PROCÉDURES ABOUTIES DEPUIS LE DERNIER COPIL / PROCEDURE COMPLETATE DALL'ULTIMO COMITATO DIRETTIVO

- Signature du règlement intérieur par l'ensemble des partenaires.

Firma del regolamento interno da parte di tutti i partner



- Formalisation et transmission de la demande d'avance auprès de l'Autorité de Gestion.

Formalizzazione e trasmissione della domanda di anticipo all'Autorità di gestione.






**APPROBATION DE LA CHARTE
GRAPHIQUE /
APPROVAZIONE DELLA CARTA
GRAFICA**



APPROBATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE / APPROVAZIONE DELLA CARTA GRAFICA

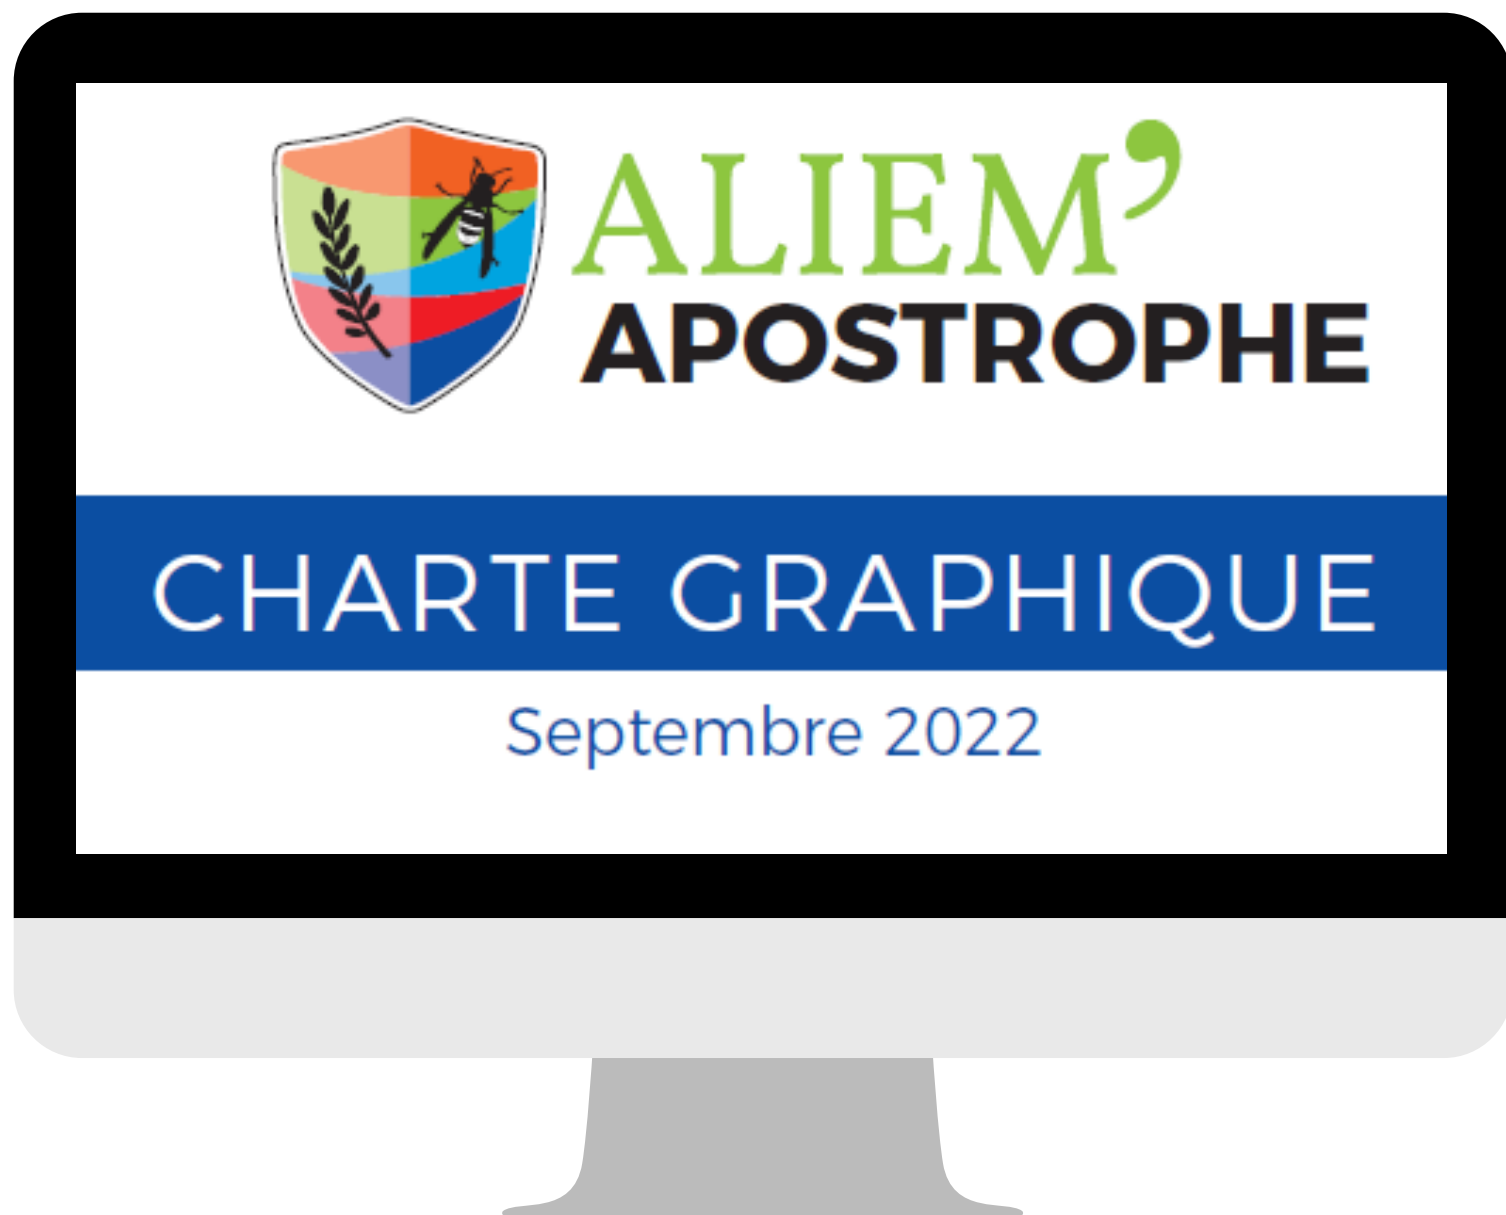

LOGOTYPE - GRAYSCALE



ALIEM'
APOSTROPHE

LOGOTYPE - CMYK



Interreg



UNION
EUROPÉENNE

MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional



ALIEM'
APOSTROPHE



RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES / PROMEMORIO E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE



RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES / PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE

- La 1ère période se terminant au **31/12/2022**, nous invitons dès à présent les partenaires italiens à se rapprocher d'un prestataire pour la certifications de leurs dépenses. / *Con il primo periodo che termina al 31/12/2022, invitiamo i partner italiani a rivolgersi a un fornitore per la certificazione delle loro spese.*
- Les dépenses certifiées seront à transmettre au chef de file dans **un délai d'un mois** à compter de la date de fin de période. / *Le spese certificate devono essere trasmesse al capofila entro un mese dalla data di fine periodo.*
- Les rapports de monitoring devront également être insérés et complétés avant le **31/01/2023**. / *Anche i rapporti di monitoraggio dovranno essere inseriti e completati entro il 31/01/2023.*



A large white graphic consisting of two parallel, slightly curved lines that taper to the right, resembling a stylized arrow or a double chevron.

PRÉSENTATION DE L'OUTIL FINANCIER SMARTSHEET / INTRODUZIONE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO SMARTSHEET



PRÉSENTATION DE L'OUTIL FINANCIER SMARTSHEET / INTRODUZIONE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO SMARTSHEET/


🕒 Tableau de bord ALIEM' : OEC ☆

ALIEM APOSTROPHE

Action pour limiter les risques de diffusion des espèces introduites envahissantes en méditerranée "APOSTROPHE"


FICHE PARTENAIRE : OEC



Composante : M	Composante : T1	Composante : T2	Composante : C
<p>Intitulé / Intitolato Gestion du projet</p> <p>Début / Inizio 30/06/2022</p> <p>Échéance / Scadenza 30/06/2023</p>	<p>Intitulé / Intitolato Consolidation opérationnelle du réseau Aliem</p> <p>Début / Inizio 30/06/2022</p> <p>Échéance / Scadenza 30/06/2023</p>	<p>Intitulé / Intitolato Plan d'Action Conjoint Transfrontalier actif et opérationnel</p> <p>Début / Inizio 30/06/2022</p> <p>Échéance / Scadenza 30/03/2023</p>	<p>Intitulé / Intitolato Communicati...</p> <p>Début / Inizio 30/06/2022</p> <p>Échéance / Scadenza 30/06/2023</p>

BUDGET DU PARTENAIRE

Budget par composante / Budget della componente

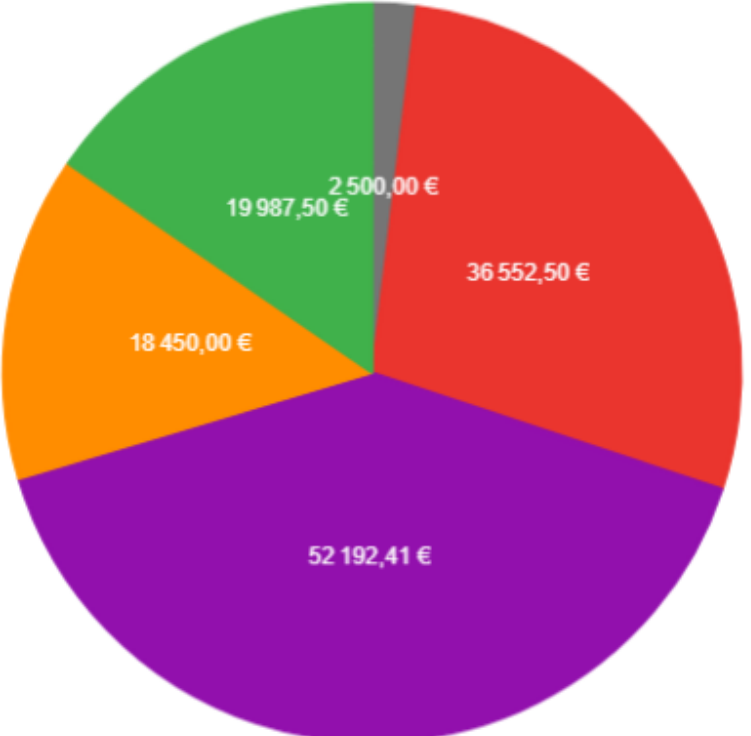

Composante	Budget (€)
P	2 500,00
M	36 552,50
T1	52 192,41
T2	18 450,00
C	19 987,50

Budget du partenaire / Budget partnerario

129 682,41 €

Budget total / Bilancio totale

499 986,20 €

Dépenses certifiées / Spese certificate

Aucune donnée à afficher

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lien budget détaillé / Collegamento di bilancio de

ALIEM A: Budget

- Afin d'assurer un suivi rigoureux au point de vue technique et financier, un nouvel outil de pilotage financier à été élaboré sur SMARTSHEET. *Per garantire un monitoraggio rigoroso dal punto di vista tecnico e finanziario, è stato sviluppato un nuovo strumento di gestione finanziaria su SMARTSHEET.*
- L'ensemble des partenaires interviendra désormais sur cet outil plus complet et plus synthétique qui sera actualisé de manière continue. *Tutti i partner interverranno ora su questo strumento più completo e sintetico, che sarà costantemente aggiornato.*
- Un guide de l'outil sera transmis au partenariat très prochainement. *Una guida dello strumento sarà trasmesso alla partnership prossimamente.*





ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRES / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T1.1 : Développement du partage transfrontalier des connaissances pour les rendre actives et opérationnelles	P01 - OEC	
T1.1.1 - Système de classification et de recherche dans la zone de ressource	P04 - CBN MED	
	Tous les partenaires	
T1.1.2 - Élaboration d'analyses transfrontalières de risques	Plusieurs partenaires	
T1.1.3 - Édition de bulletins d'alertes et de vigilance	Plusieurs partenaires	
T1.1.4 - Interactions ciblées à partir de notifications	P01 - OEC	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T1.2 : Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
T1.2.1 - Capitalisation sur l'expo itinérante	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
T1.2.2 - Digitalisation des supports de sensibilisation des publics et création de sentiers découvertes virtuels	P03 - CD VAR - MUSEUM	
T1.2.2' - Sensibilisation des scolaires et publics aux sciences participatives	P03 - CD VAR - MUSEUM	
Activités didactiques	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
T1.2.3 - Digitalisation et numérisation - Version en ligne des outils produits	P01 - OEC	
T1.2.4 - Formation en ligne des acteurs du réseau de vigilance et sensibilisation	P06 - ARPAL	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T1.3 : Développement des formations transfrontalières des acteurs de vigilance	P06 - ARPAL	
T1.3.1 - Identification des "portes d'entrées"	P06 - ARPAL	
	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
	P01 - OEC	
T1.3.2 - Identification des les sujets les plus impliqués dans les activités de surveillance	P06 - ARPAL	
T1.3.3 - Formations	P06 - ARPAL	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention	P08 - UNISS	
T2.1.1 : Utilisation de techniques de diagnostic rapide pour l'identification de la présence de la Vespa Velutina	P02 - UNIFI	
T2.1.2 : Surveillance par l'utilisation de drones appliqué du développement de Baccharis halimifolia	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
	P01 - OEC	
	P04 - CBN MED	
T2.1.3: Action pilote de monitoring des espèces invasives de frelons (Vespa crabo, V. Velutina, V. Orientalis) dans les territoires insulaires	P07 - UNISS	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
T2.1.4	P02 - UNIFI	
T2.1.5 Consolidation du réseau de surveillance	P06 - ARPAL	
T2.1.6 Repérage et contrôle du <i>Scyphophorus acupunctatus</i> (charançon de l'agave noir) (activité réalisée par DISTAV)	P06 - ARPAL	
T2.1.7 Définition d'une corrélation entre les espèces exotiques envahissantes et les habitats	Plusieurs partenaires	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T2.2 : Actions pilotes de limitation et de gestion	P08 - UNISS	
T2.2.1 : Mise en œuvre d'outils intelligents pour la gestion des zones infestées.	P02 - UNIFI	
T2.2.2 : Contrôle du développement des espèces d'Acacia sur le territoire transfrontalier.	P08 - UNISS	
	P04 - CBN MED	
T2.2.3 Surveillance et expérimentation pour la défense contre Charançon rouge du palmier (activité réalisée par DISTAV)	P06 - ARPAL	
	P04 - CBN MED	
T2.2.4 Contrôle d'Ailanthus altissima par des techniques soutenables combinées (mécanico-chimiques) à faible volume (activité réalisée par DISTAV)	P06 - ARPAL	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T2.3 : Actions pilotes alternatives, curatives ou d'éradication	P08 - UNISS	
T2.3.1 : Action pilote de reconstitution de la biodiversité dans des zones infestées	P04 - CBN MED	
	P03 - CD VAR - MUSEUM	
T2.3.2: Azione di eradicazione di <i>C. perspectalis</i> su <i>B. balearica</i>	P07 - UNISS	
T2.3.3 : Action curative du <i>Senecio inaequidens</i>	P07 - UNISS	
T2.3.4 : Action curative sur <i>Senecio angulatus</i> et <i>Arauja sericifera</i>	P04 - CBN MED	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité C.1 : Mise à jour des éléments de communication	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
C.1.1 Charte graphique et d'identification visuelle	P01 - OEC	
C.1.2 Plan de communication du projet	P01 - OEC	
C.1.3 Site internet "vitrine" du projet	P01 - OEC	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité C.3 : Publications d'objets de promotion digitale et de sensibilisation aux problématiques EEE	P01 - OEC	
C.3.1 - Conception et édition	P01 - OEC	
Activité C.4 : Action d'animation digitale sur les réseaux sociaux - sensibilisation des groupes cibles	P06 - ARPAL	
C.4.1 Création de profils sur les principaux réseaux sociaux	P06 - ARPAL	
C.4.2 Animation réseaux sociaux.	Tous les partenaires	



DEMANDE DE MODIFICATION ?

RICHIESTE DI MODIFICHE ?



Interreg



Cofinanziato
dall'Unione europea
Cofinancé par
l'Union européenne

Marittimo-IT FR-Maritime



PERSPECTIVES FUTURES

PROGRAMME INTERREG MARITTIMO 2021-2027





ALIEM'
APOSTROPHE



ECHANGES ENTRE LES PARTENAIRES SCAMBII TRA I PARTNER





MERCI À TOUS !
GRAZIE À TUTTI !



CDINNOV
www.cdinnov.eu



Interreg



MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional



ALIEM²
APOSTROPHE

ALIEM APOSTROPHE

Action pour limiter les risques de diffusion des espèces introduites envahissantes en Méditerranée « APOSTROPHE »

3ème Comité de pilotage /
3° Comitato di pilotaggio

07/03/2023 - Livourne

CULLETTIVITÀ DI **CORSICA**
COLLECTIVITÉ DE **CORSE**

Uffiziu di l' Ambiente
di a Corsica
Office de l' Environnement
de la Corse



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
BIO
DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI




ORDRE DU JOUR - ORDINE DEL GIORNO



ALIEM⁹
APOSTROPHE

-  VALIDATION DU PLAN DE COMMUNICATION ET APPROBATION DE LA DEMANDE DE PROROGATION/
CONVALIDA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI PROROGA/
-  ÉTAT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT N°1 / *STATO DELLA DOMANDA DI RIMBORSO N°1*
-  RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES / *PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE*
-  ÉTAT DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES / *STATO DEGLI IMPEGNI DI SPESE*
-  ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRES / *STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER*
-  ÉCHANGES ENTRE LES PARTENAIRES / *SCAMBII TRA I PARTNER*

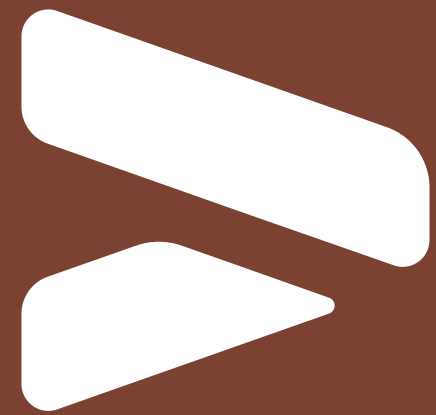

**VALIDATION DU PLAN DE COMMUNICATION ET
APPROBATION DE LA DEMANDE DE PROROGATION/
CONVALIDA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E
APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI PROROGA/**



VALIDATION DU PLAN DE COMMUNICATION / CONVALIDA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE


- Nous profitons de ce comité de pilotage, pour soumettre le plan de communication mis à jour à validation du partenariat / *Approfittiamo di questo comitato direttivo per presentare il piano di comunicazione aggiornato alla convalida del partenariato :*



Titolo	Piano di comunicazione interregionale ALIEM APOSTROPHE
Prodotto n°	C.1.2
Autore	Office de l'Environnement de la Corse
Data	06/03/2023
Versione	Marzo 2023 Versione finale

SOMMARIO

1	Introduzione.....	3
2	Attività di comunicazione del progetto.....	3
	Veste grafica, sito web e strumenti di comunicazione	3
	Eventi pubblici	4
	Pubblicazioni	5
	Attività informatiche	6
	Piattaforma transfrontaliera	6
	Piano d'azione congiunto arricchito.....	7
3	Strumenti di comunicazione e cronoprogramma	14
4	Spese previste per gli strumenti di comunicazione	15



APPROBATION DE LA DEMANDE DE PROROGATION/ APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI PROROGA

- Au vu des courts délais dont nous disposons pour réaliser l'ensemble des activités prévus dans le cadre d'ALIEM', nous souhaiterions solliciter une demande de prorogation de 120 jours auprès de l'AG, c'est pourquoi nous soumettons cette demande à l'approbation des partenaires. / *Dato il breve tempo di cui disponiamo per realizzare tutte le attività previste nell'ambito di ALIEM', vorremmo richiedere una proroga di 120 giorni all'AG, per questo sottoponiamo questa richiesta all'approvazione dei partner.*




ÉTAT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT N°1 / STATO DELLA DOMANDA DI RIMBORSO N°1



ÉTAT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT N°1 / STATO DELLA DOMANDA DI RIMBORSO N°1

- La demande de remboursement n°1 à été transmise à l'Autorité de Gestion ce lundi 06 mars. / *La prima domanda di rimborso è stata trasmessa all'Autorità di gestione lunedì 06 marzo.*



RAPPELS ET SUIVI DES ÉCHÉANCES / PROMEMORIO E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE



RAPPELS ET SUIVI DES ÉCHÉANCES / PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE

- Nous invitons les partenaires qui ne l'ont pas déjà fait à insérer et compléter leurs rapports de monitoring sur la plateforme / *Invitiamo i partner che non l'hanno già fatto ad inserire e integrare i loro rapporti di monitoraggio sulla piattaforma/*
- Il convient de rappeler aux partenaires que sauf approbation d'un délai de prorogation par l'AG, la 2nd et dernière période se termine au 30/06/2023, la date limite de réception des dépenses certifiées est fixé au 31/07/2023 avec un envoi de la DR finale au 30/08 auxquels s'en suivront 2 mois de clôture administrative. / *Si ricorda ai partner che, salvo approvazione di un periodo di proroga da parte dell'AG, il secondo e ultimo periodo termina il 30/06/2023, il termine ultimo per la ricezione delle spese certificate è fissato al 31/07/2023 con l'invio della DR finale al 30/08 cui seguiranno 2 mesi di chiusura amministrativa.*






ÉTAT DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES / STATO DEGLI IMPEGNI DI SPESE



ÉTATS DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES/ STATO DEGLI IMPEGNI DI SPESE

- La répartition des dépenses engagées par les partenaires est la suivante :

- OEC : 12 661,97 € (9,8%)
- UNIFI : 11 754,81 € (23,51 %)
- UNISS : 22 210, 07 € (24,93 %)
- TOTAL DRI : 46 626, 85 € (9 %)**

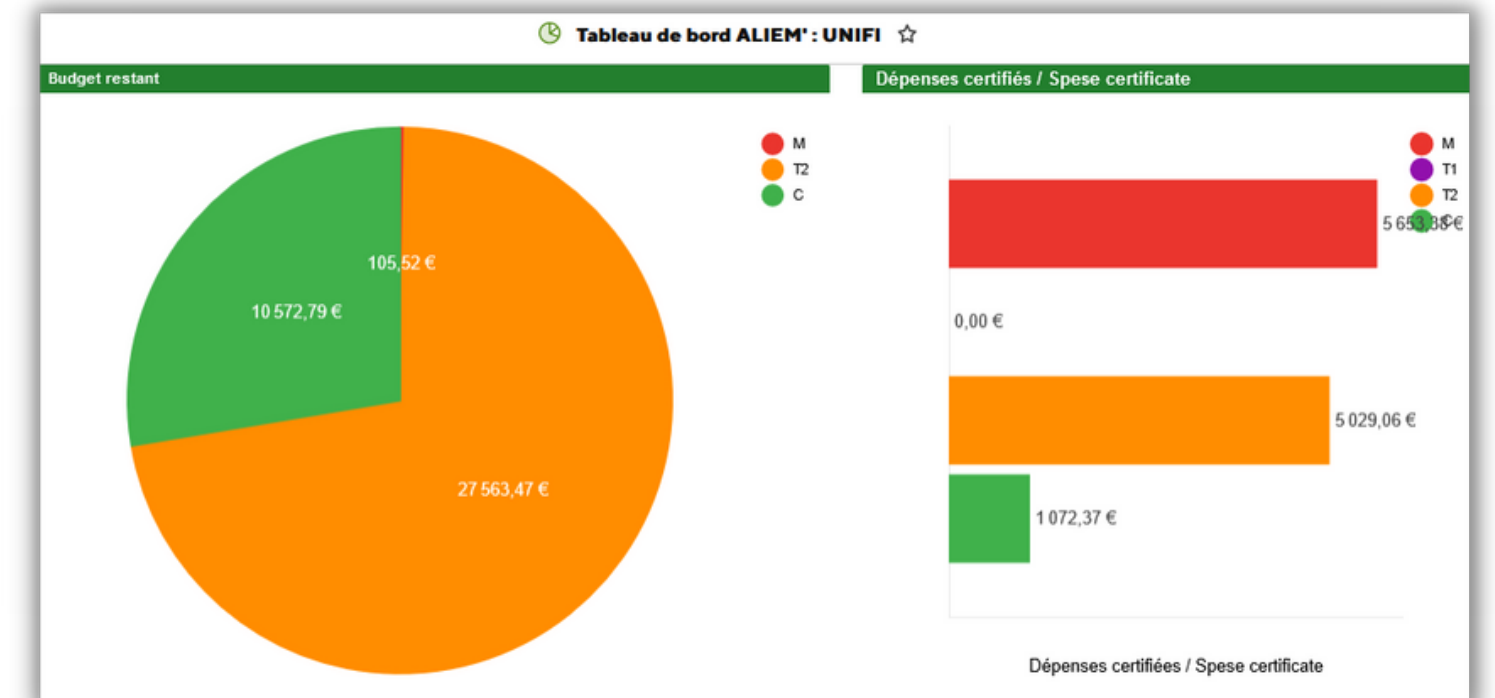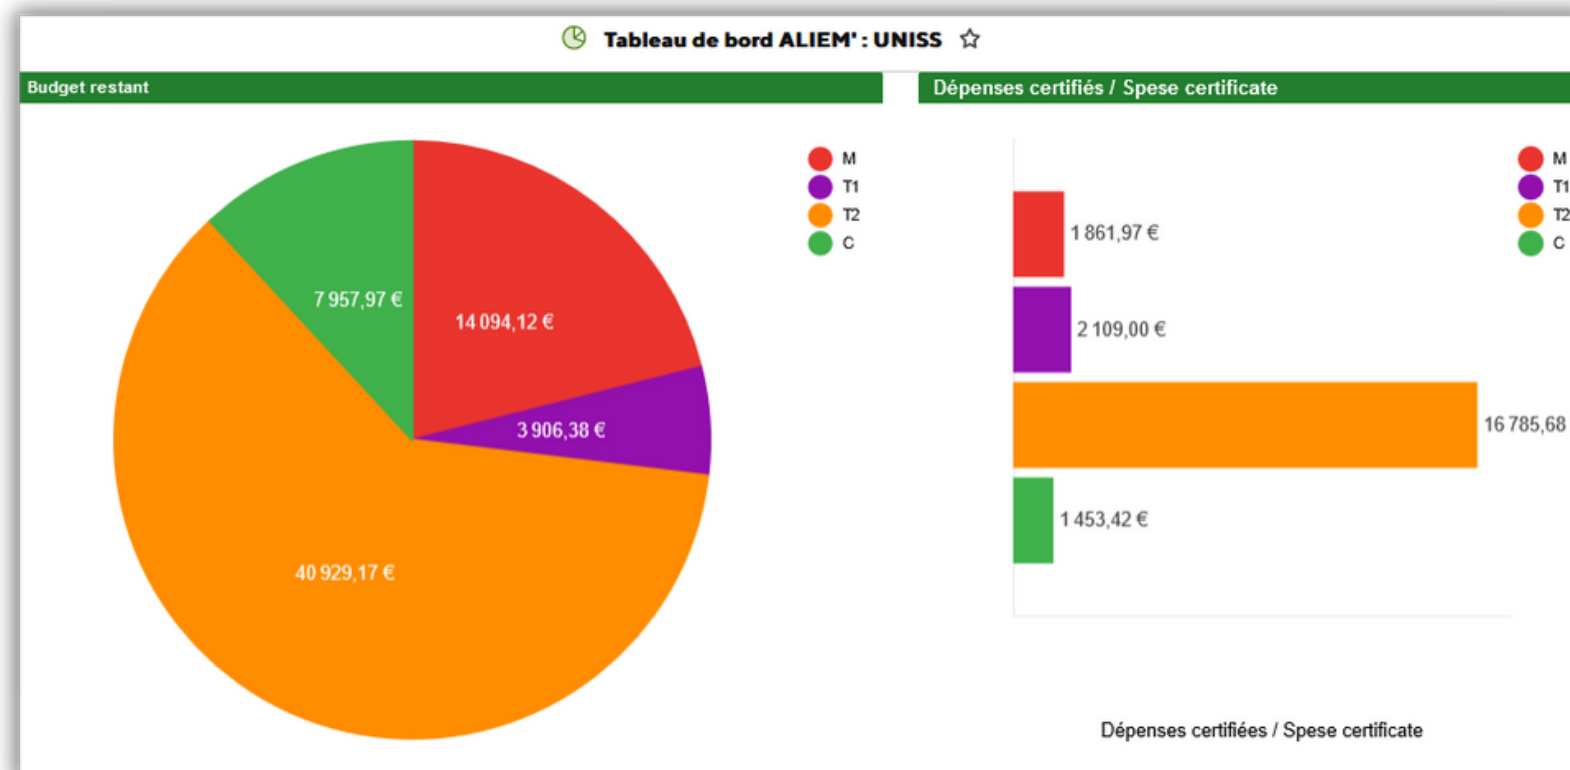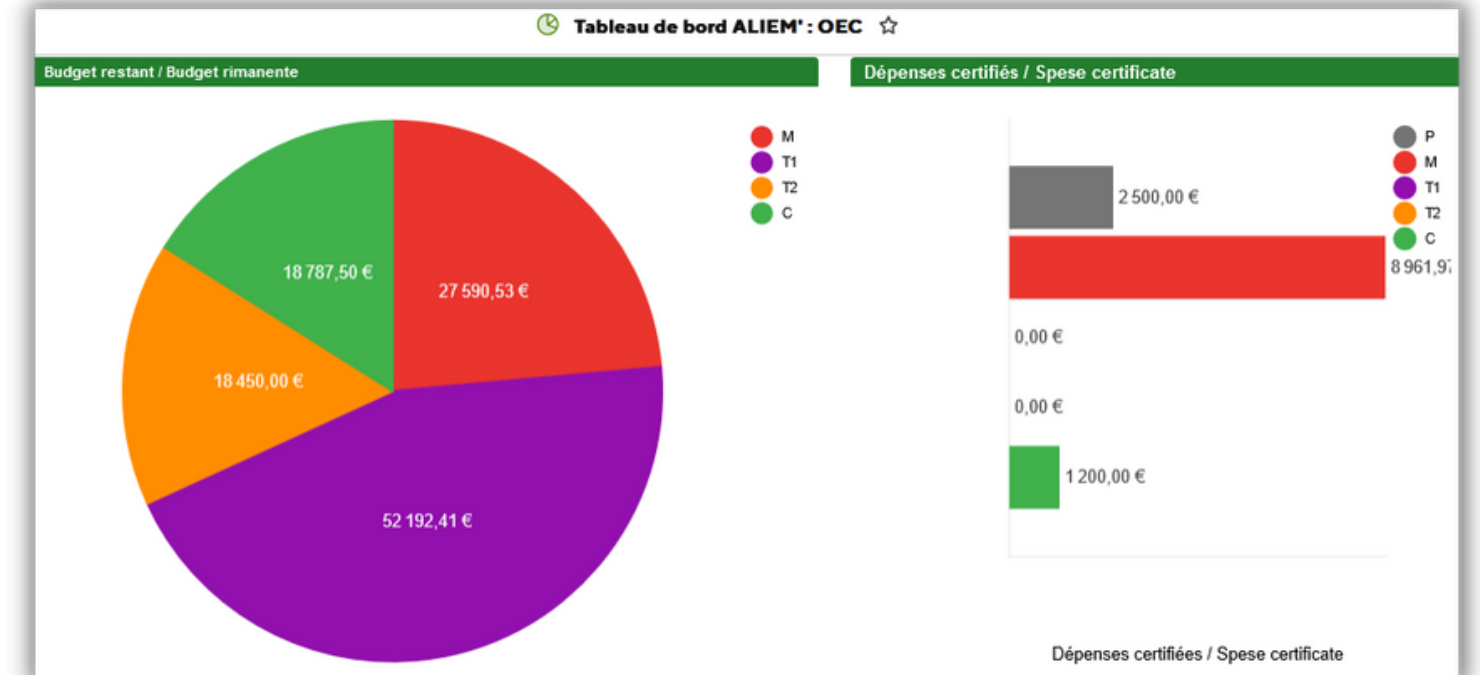

A large, white, stylized arrow graphic pointing to the right, composed of two parallel lines that taper to a point.

ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRES / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T1.1 : Développement du partage transfrontalier des connaissances pour les rendre actives et opérationnelles	P01 - OEC	
T1.1.1 - Système de classification et de recherche dans la zone de ressource	P04 - CBN MED	
	Tous les partenaires	
T1.1.2 - Élaboration d'analyses transfrontalières de risques	Plusieurs partenaires	
T1.1.3 - Édition de bulletins d'alertes et de vigilance	P06 - ARPAL P01 - OEC	
T1.1.4 - Interactions ciblées à partir de notifications	P01 - OEC	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T1.2 : Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
T1.2.1 - Capitalisation sur l'expo itinérante	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
T1.2.2 - Digitalisation des supports de sensibilisation des publics et création de sentiers découvertes virtuels	P03 - CD VAR - MUSEUM	
T1.2.2' - Sensibilisation des scolaires et publics aux sciences participatives	P03 - CD VAR - MUSEUM	
Activités didactiques	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
T1.2.3 - Digitalisation et numérisation - Version en ligne des outils produits	P01 - OEC	
T1.2.4 - Formation en ligne des acteurs du réseau de vigilance et sensibilisation	P06 - ARPAL	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T1.3 : Développement des formations transfrontalières des acteurs de vigilance	P06 - ARPAL	
T1.3.1 - Identification des "portes d'entrées"	P06 - ARPAL	
	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
	P01 - OEC	
T1.3.2 - Identification des les sujets les plus impliqués dans les activités de surveillance	P06 - ARPAL	
T1.3.3 - Formations	P06 - ARPAL	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention	P08 - UNISS	
T2.1.1 : Utilisation de techniques de diagnostic rapide pour l'identification de la présence de la Vespa Velutina	P02 - UNIFI	
T2.1.2 : Surveillance par l'utilisation de drones appliqué du développement de Baccharis halimifolia	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
	P01 - OEC	
	P04 - CBN MED	
T2.1.3: Action pilote de monitoring des espèces invasives de frelons (Vespa crabo, V. Velutina, V. Orientalis) dans les territoires insulaires	P07 - UNISS	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
T2.1.4	P02 - UNIFI	
T2.1.5 Consolidation du réseau de surveillance	P06 - ARPAL	
T2.1.6 Repérage et contrôle du <i>Scyphophorus acupunctatus</i> (charançon de l'agave noir) (activité réalisée par DISTAV)	P06 - ARPAL	
T2.1.7 Définition d'une corrélation entre les espèces exotiques envahissantes et les habitats	Plusieurs partenaires	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T2.2 : Actions pilotes de limitation et de gestion	P08 - UNISS	
T2.2.1 : Mise en œuvre d'outils intelligents pour la gestion des zones infestées.	P02 - UNIFI	
T2.2.2 : Contrôle du développement des espèces d'Acacia sur le territoire transfrontalier.	P08 - UNISS	
	P04 - CBN MED	
T2.2.3 Surveillance et expérimentation pour la défense contre Charançon rouge du palmier (activité réalisée par DISTAV)	P06 - ARPAL	
	P04 - CBN MED	
T2.2.4 Contrôle d'Ailanthus altissima par des techniques soutenables combinées (mécanico-chimiques) à faible volum (activité réalisée par DISTAV)	P06 - ARPAL	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité T2.3 : Actions pilotes alternatives, curatives ou d'éradication	P08 - UNISS	
T2.3.1 : Action pilote de reconstitution de la biodiversité dans des zones infestées	P04 - CBN MED	
	P03 - CD VAR - MUSEUM	
T2.3.2: Azione di eradicazione di <i>C. perspectalis</i> su <i>B. balearica</i>	P07 - UNISS	
T2.3.3 : Action curative du <i>Senecio inaequidens</i>	P07 - UNISS	
T2.3.4 : Action curative sur <i>Senecio angulatus</i> et <i>Arauja sericifera</i>	P04 - CBN MED	



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité C.1 : Mise à jour des éléments de communication	P05 - PROVINCIA LIVORNO	
C.1.1 Charte graphique et d'identification visuelle	P01 - OEC	Terminé / Completato
C.1.2 Plan de communication du projet	P01 - OEC	Terminé / Completato
C.1.3 Site internet "vitrine" du projet	P01 - OEC	En cours / In Corso



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRE / STATO D'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER

Nom de l'activité / Nome dell'attività	Partenaire resp. / Partner resp.	État / Stato
Activité C.3 : Publications d'objets de promotion digitale et de sensibilisation aux problématiques EEE	P01 - OEC	
C.3.1 - Conception et édition	P01 - OEC	
Activité C.4 : Action d'animation digitale sur les réseaux sociaux - sensibilisation des groupes cibles	P06 - ARPAL	
C.4.1 Création de profils sur les principaux réseaux sociaux	P06 - ARPAL	
C.4.2 Animation réseaux sociaux.	Tous les partenaires	



PROPOSITION DE MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES / PROPOSTA DI MODIFICHE DI BILANCIO

DEMANDE DE MODIFICATION ?

RICHIESTE DI MODIFICHE ?






ALIEM'
APOSTROPHE



ECHANGES ENTRE LES PARTENAIRES SCAMBII TRA I PARTNER



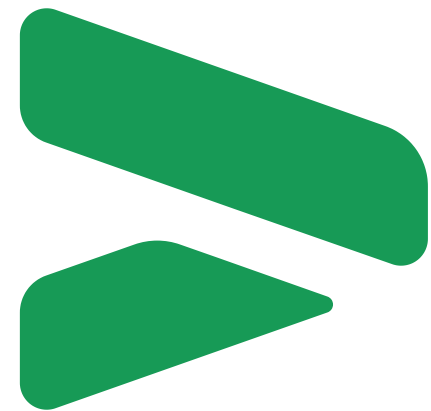

MERCI À TOUS !
GRAZIE À TUTTI !



Interreg



UNION
EUROPÉENNE

MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional



ALIEM²
APOSTROPHE

ALIEM APOSTROPHE

Action pour limiter les risques de diffusion des espèces introduites envahissantes en Méditerranée « APOSTROPHE »

4ème Comité de pilotage /
4° Comitato di pilotaggio

22/06/2023 - Visioconférence

COLLETTIVITÀ DI **CORSICA**
COLLECTIVITÉ DE **CORSE**

UFFIZIU di l' Ambiente
a Corsica
Office de l' Environnement
de la Corse



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
BIO
DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI



ORDRE DU JOUR

— ORDINE DEL GIORNO



ALIEM⁹
APOSTROPHE

- **RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES ADMINISTRATIVES / *PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE***
- **DEMANDE DE MODIFICATION BUDGETAIRE / *RICHIESTA DI MODIFICA DI BILANCIO***
- **ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRES / *STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER***
- **ÉTAT D'AVANCEMENT DES LIVRABLES / *STATO DI AVANZAMENTO DEI PRODOTTI***
- **ÉCHANGES ENTRE LES PARTENAIRES / *SCAMBII TRA I PARTNER***

A large, white, stylized arrow graphic pointing to the right, composed of two parallel lines that taper to a point.

RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES ADMINISTRATIVES / PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE



RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES ADMINISTRATIVES / PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE

- La 3ème de modification à été approuvée en date du 26/04/2023. En ce sens, les activités prévues dans le cadre du projet pourront être poursuivies jusqu'au **29/10/2023**. / *La terza modifica è stata approvata il 26/04/2023. In questo senso, le attività previste nel quadro del progetto potranno essere proseguite fino al 29/10/2023.*
- Concernant la 2nd DR, les dépenses devront être certifiées et transmises au chef de file avant le **10/08/2023**. / *Per quanto riguarda la seconda rendicontazione, le spese dovranno essere certificate e trasmesse al capofila entro il 10/08/2023.*
- Les livrables devront être formalisés et transmis au Chef de File avant la date du **29/09/2023**. / *I prodotti finali dovranno essere formalizzati e trasmessi al Capofila entro il 30/09/2023.*
- Les rapports de monitoring P2 devront être insérés sur le système de gestion **dès** la clôture de vos activités. / *I rapporti di monitoraggio P2 dovranno essere inseriti nel sistema di gestione **al termine** delle vostre attività.*



DEMANDE DE MODIFICATION BUDGETAIRE / RICHIESTA DI MODIFICA DI BILANCIO



DEMANDE DE MODIFICATION BUDGETAIRE / RICHIESTA DI MODIFICA DI BILANCIO

- Le partenaire ARPAL souhaite procéder à une modification budgétaire, en ce sens, nous profitons de ce comité de pilotage pour demander à l'ensemble des partenaires s'ils souhaitent également soumettre une demande de modification budgétaire. / *Il partner ARPAL desidera apportare una modifica al bilancio, in questo senso, approfittiamo di questo comitato direttivo per chiedere a tutti i partner se desiderano presentare anche una richiesta di modifica del bilancio.*



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS
PAR PARTENAIRES /
STATO D'AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITÀ PER PARTNER



État d'avancement des activités par partenaire / Stato d'avanzamento delle attività per partner

Composante / Composante	Nom de l'activité / Nome dell'attività	Tâches / Compiti	État / Stato
T1	T1.1 : Développement du partage transfrontalier des connaissances pour les rendre actives et opérationnelles	T1.1.1 - Système de classification et de recherche dans la zone de ressource	
	T1.2 : Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles	T1.2.3 - Digitalisation et numérisation - Version en ligne des outils produits	
T2	T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention	T2.1.2 : Utilisation de pièges de surveillance pour les coléoptères xylophages invasifs	



État d'avancement des activités par partenaire / Stato d'avanzamento delle attività per partner

Composante / Compone nte	Nom de l'activité / Nome dell'attività	Tâches / Compiti	État / Stato
T2	T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention	T2.1.1 : Utilisation de techniques de diagnostic rapide pour l'identification de la présence de la Vespa Velutina	
		T2.1.4 : Surveillance de V. velutina et V. orientalis en Toscane	
	T2.2 : Actions pilotes de limitation et de gestion	T2.2.1 : Mise en œuvre d'outils intelligents pour la gestion des zones infestées.	
C	C.2 : Évènements dématérialisés ou en présence	C.2.1 : Webinar thématiques	

État d'avancement des activités par partenaire / Stato d'avanzamento delle attività per partner

Composante / Composante	Nom de l'activité / Nome dell'attività	Tâches / Compiti	État / Stato
T1	T1.2 : Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles	T1.2.2 - Digitalisation des supports de sensibilisation des publics et création de sentiers découvertes virtuels	
		T1.2.2 - Sensibilisation des scolaires et publics aux sciences participatives	
T2	T2.3.1 : Action pilote de reconstitution de la biodiversité dans des zones infestées	T2.1.2 : Utilisation de pièges de surveillance pour les coléoptères xylophages invasifs	
C	C.3 - Publications d'objets de promotion digitale et de sensibilisation aux problématiques des EEE	C.3.1 - Impression de supports itinérants à la communication	

État d'avancement des activités par partenaire / Stato d'avanzamento delle attività per partner

Composante / Componente	Nom de l'activité / Nome dell'attività	Tâches / Compiti	État / Stato
T2	T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention	T2.1.2 : Utilisation de pièges de surveillance pour le suivi des coléoptères ravageurs du figuier et du mûrier dans les vergers conservatoires de l'île de Porquerolles	
	T2.2 : Actions pilotes de limitation et de gestion	T2.2.2 : Retour d'expérience de gestion sur <i>Acacia dealbata</i> sur le littoral varois au Cap Lardier.	
		T2.2.3 : Expérimentation de multiplication de rejets de palmiers dattiers tolérants au charançon de la collection de Porquerolles	
	T2.3 : Actions pilotes alternatives, curatives ou d'éradication	T2.3.1 : Opérations de génie écologique à Ramatuelle	
		T2.3.4 : Action curative sur <i>Senecio angulatus</i> et <i>Arauja sericifera</i>	

État d'avancement des activités par partenaire / Stato d'avanzamento delle attività per partner

Composant e/ Componen te	Nom de l'activité / Nome dell'attività	Tâches / Compiti	État / Stato
T1	T1.2 : Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles	T1.2.1 - Capitalisation sur l'expo itinérante	TERMINÉ / COMPLETATO
		T1.2.2 - Activités didactiques	
	T1.3 : Développement des formations transfrontalières des acteurs de vigilance	T1.3.1 - Vigilance et monitoring de l'entrée d'EEE au port de Livourne.	
T2	T2.1 - Actions pilotes de repérage et de prévention	T2.1.2 : Surveillance par l'utilisation de drones appliqué au développement de <i>Baccharis halimifolia</i>	
C	C.2 - Événements dématérialisés ou en présence	C.2.1 - Webinar thématiques	

État d'avancement des activités par partenaire / Stato d'avanzamento delle attività per partner

Composante / Componente	Nom de l'activité / Nome dell'attività	Tâches / Compiti	État / Stato
T1	T1.2 : Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles	T1.2.4 - Formation en ligne des acteurs du réseau de vigilance et sensibilisation	TERMINÉ / COMPLETATO
	T1.3 : Développement des formations transfrontalières des acteurs de vigilance	T1.3.1 - Identification des "portes d'entrées"	
		T1.3.2 - Identification des les sujets les plus impliqués dans les activités de surveillance	
T2	T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention	T2.1.2 : Surveillance par l'utilisation de drones appliqué du développement de Baccharis halimifolia	
		T2.1.5 : Consolidation du réseau de surveillance	
		T2.1.6 : Repérage et contrôle du Scyphophorus acupunctatus (charançon de l'agave noir) (activité réalisée par DISTAV)	
		T2.2.4 : Contrôle d'Ailanthus altissima par des techniques soutenables combinées (mécanico-chimiques) à faible volume	
		T1.3.3 - Formations	
C	C.4 : Action d'animation digitale sur les réseaux sociaux	C.4.1 - Création de profils sur les principaux réseaux sociaux	



État d'avancement des activités par partenaire / Stato d'avanzamento delle attività per partner

Composante / Componente	Nom de l'activité / Nome dell'attività	Tâches / Compiti	État / Stato
T2	T2.1 : Actions pilotes de repérage et de prévention	T2.1.3: Action pilote de monitoring des espèces invasives de frelons (Vespa crabo, V. Velutina, V. Orientalis) dans les territoires insulaires	
	T2.2 : Actions pilotes de limitation et de gestion	T2.2.2 : Contrôle du développement des espèces d'Acacia sur le territoire transfrontalier.	
	T2.3 : : Actions pilotes alternatives, curatives ou d'éradication	T2.3.2: Azione di eradicazione di C. perspectalis su B. balearica	
		T2.3.2: Action curative du Senecio inaequidens	

ÉTAT D'AVANCEMENT DES LIVRABLES

STATO DI AVANZAMENTO DEI
PRODOTTI



ÉTAT D'AVANCEMENT DES LIVRABLES / STATO DI AVANZAMENTO DEI PRODOTTI

Activité / Attività	Livrables / Prodotto	Échéances prévues / Scadenze previste	Partenaires responsables / Partner responsabile
Pilotage du projet	M1.1 - Rapport des décisions du CdP	10/23	OEC
Monitoring des activités et des dépenses et évaluation qualitative des activités	M.2.1 - Rapport de monitoring	10/23	OEC
	M.2.2 - Evaluation qualitative de l'avancement des engagements	10/23	OEC
Comptes-rendus des activités et états financiers	M 3.1 - Rapport Annuel des CR	10/23	OEC
	M 3.2 - Rapport Annuel des Certificats	10/23	OEC
Mise à jour des éléments de communication	C.1.1 – Plan de communication mis à jour		
	C.1.2 - Charte graphique et visuelle du projet	01/23	OEC
	C.1.3 - Site Internet Aliem mis à jour	01/23	OEC
Événements dématérialisés ou en présence	C.2.1 - Rapport événement de lancement	10/23	OEC
	C 2.2 - Rapports des événements coordonnés transfrontaliers	10/23	PROVINCIA DI LIVORNO
	C 2.3 - Rapport événement final	10/23	OEC
Publications d'objets de promotion digitale et de sensibilisation aux problématiques EEE	C.3.1 - Publications, éditions et productions du projet	10/23	TOUS
Action d'animation digitale sur les réseaux sociaux - sensibilisation des groupes cibles	C.4.1 - Rapport des actions de sensibilisation et d'information sur le media social	10/23	ARPAL
Développement du partage transfrontalier des connaissances pour les rendre actives et opérationnelles	T1.1.1 - Classeur des fiches de risques	01/23	OEC
Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles	T1.2.1 - Visite virtuelle de l'exposition sur les espèces Aliens	02/23	PROVINCIA DI LIVORNO
	T1.2.2 - Jeux dématérialisés en ligne	07/23	OEC
	T1.2.3 - Supports de formation en ligne	02/23	ARPAL
Développement des formations transfrontalières des acteurs de vigilance	T1.3.1 – Recueil de conventions et protocoles d'accords « types » pour des interventions de formations	07/23	PROVINCIA DI LIVORNO / ARPAL
Actions pilotes de repérage et de prévention	T 2.1.1 - Catalogue des actions pilotes transfrontalières de repérage et de prévention	10/23	UNISS
Actions pilotes de limitation et de gestion	T 2.2.2 - Catalogue des actions pilotes transfrontalières de limitation et de gestion	10/23	UNISS
Actions pilotes alternatives, curatives ou d'éradication	T 2.3.1 - Catalogue des actions pilotes transfrontalières alternatives, curatives et d'éradication	10/23	UNISS



ALIEM⁹
APOSTROPHE



ECHANGES ENTRE LES PARTENAIRES SCAMBII TRA I PARTNER



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



cbn CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
MEDITERRANEEN



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI



ALIEM²
APOSTROPHE



MERCI À TOUS !
GRAZIE À TUTTI !



Interreg



UNION
EUROPÉENNE

MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional



ALIEM²
APOSTROPHE

ALIEM APOSTROPHE

Action pour limiter les risques de diffusion des espèces introduites envahissantes en Méditerranée « APOSTROPHE »

5ème Comité de pilotage /
5° Comitato di pilotaggio

20/10/2023 - Corte

COLLETTIVITÀ DI **CORSICA**
COLLETTIVITÀ DE **CORSE**

UFFIZIU DI L'Ambiente
a Corsica
Office de l'Environnement
de la Corse



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
BIO
DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI



ORDRE DU JOUR

— ORDINE DEL GIORNO



ALIEM⁹
APOSTROPHE

- **RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES ADMINISTRATIVES / *PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE***
- **DEMANDE DE MODIFICATION BUDGETAIRE / *RICHIESTA DI MODIFICA DI BILANCIO***
- **ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PAR PARTENAIRES / *STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER PARTNER***
- **ÉTAT D'AVANCEMENT DES LIVRABLES / *STATO DI AVANZAMENTO DEI PRODOTTI***
- **ÉCHANGES ENTRE LES PARTENAIRES / *SCAMBII TRA I PARTNER***

A large, white, stylized arrow graphic pointing to the right, composed of two parallel lines that taper to a point on the right side.

RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES ADMINISTRATIVES / PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE



RAPPEL ET SUIVI DES ÉCHÉANCES ADMINISTRATIVES / PROMEMORIA E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE

- La 5ème demande de modification budgétaire effectuée par consultation écrite à été approuvée en date du 29/09/2023. / *La quinta richiesta di modifica del bilancio effettuata mediante consultazione scritta è stata approvata il 29/09/2023.*
- Une demande de prorogation d'un mois pour la finalisation des derniers livrables à été formulée auprès de l'Autorité de Gestion. Pour l'instant, les délais à considérer restent les suivants / *Una richiesta di proroga di un mese per la finalizzazione degli ultimi risultati finali è stata presentata all'Autorità di gestione. Per il momento, i termini da considerare sono i seguenti :*
 - Concernant la **DR finale**, les dépenses devront être certifiées et transmises au chef de file avant le **26/10/2023**. / *Per quanto riguarda la DR finale, le spese dovranno essere certificate e trasmesse al capofila entro il 26/10/2023.*
 - Les livrables devront être formalisés et transmis au Chef de File avant la date du **26/10/2023**. / *I risultati finali dovranno essere formalizzati e trasmessi al Capofila prima della data del 26/10/2023.*
 - Les rapports de monitoring P3 devront être insérés sur le système de gestion **dès** la clôture de vos activités. / *I rapporti di monitoraggio P3 dovranno essere inseriti nel sistema di gestione al termine delle vostre attività.*



ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS
PAR PARTENAIRES /
STATO D'AVANZAMENTO DELLE
ATTIVITÀ PER PARTNER

ÉTAT D'AVANCEMENT DES LIVRABLES

STATO DI AVANZAMENTO DEI
PRODOTTI



ÉTAT D'AVANCEMENT DES LIVRABLES / STATO DI AVANZAMENTO DEI PRODOTTI

Activité / Attività	Livrables / Prodotto	Partenaires responsables / Partner responsabile	État / Stato
Pilotage du projet	M1.1 - Rapport des décisions du CdP	OEC	
Monitoring des activités et des dépenses et évaluation qualitative des activités	M.2.1 - Rapport de monitoring	OEC	
	M.2.2 - Evaluation qualitative de l'avancement des engagements	OEC	
Comptes-rendus des activités et états financiers	M 3.1 - Rapport Annuel des CR	OEC	
	M 3.2 - Rapport Annuel des Certificats	OEC	
Mise à jour des éléments de communication	C.1.1 – Plan de communication mis à jour	OEC	
	C.1.2 - Charte graphique et visuelle du projet	OEC	
	C.1.3 - Site Internet Aliem mis à jour	OEC	
Événements dématérialisés ou en présence	C.2.1 - Rapport événement de lancement	OEC	
	C 2.2 - Rapports des événements coordonnés transfrontaliers	PROVINCIA DI LIVORNO	
	C 2.3 - Rapport événement final	OEC	
Publications d'objets de promotion digitale et de sensibilisation aux problématiques EEE	C.3.1 - Publications, éditions et productions du projet	TOUS	
Action d'animation digitale sur les réseaux sociaux - sensibilisation des groupes cibles	C.4.1 - Rapport des actions de sensibilisation et d'information sur le media social	ARPAL	
Développement du partage transfrontalier des connaissances pour les rendre actives et opérationnelles	T1.1.1 - Classeur des fiches de risques	OEC	
Développement des actions transfrontalières de vigilance et de sensibilisation des publics cibles	T1.2.1 - Visite virtuelle de l'exposition sur les espèces Aliens	PROVINCIA DI LIVORNO	
	T1.2.2 - Jeux dématérialisés en ligne	OEC	
	T1.2.3 - Supports de formation en ligne	ARPAL	
Développement des formations transfrontalières des acteurs de vigilance	T1.3.1 – Recueil de conventions et protocoles d'accords « types » pour des interventions de formations	PROVINCIA DI LIVORNO / ARPAL	
Actions pilotes de repérage et de prévention	T 2.1.1 - Catalogue des actions pilotes transfrontalières de repérage et de prévention	UNISS	
Actions pilotes de limitation et de gestion	T 2.2.2 - Catalogue des actions pilotes transfrontalières de limitation et de gestion	UNISS	
Actions pilotes alternatives, curatives ou d'éradication	T 2.3.1 - Catalogue des actions pilotes transfrontalières alternatives, curatives et d'éradication	UNISS	
OUTPUT : Plan d'Action Conjoint Transfrontalier enrichi	-	UNISS	



ALIEM⁹
APOSTROPHE



ECHANGES ENTRE LES PARTENAIRES SCAMBII TRA I PARTNER



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



cbn CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
MEDITERRANEEN



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI



ALIEM²
APOSTROPHE



MERCI À TOUS !
GRAZIE À TUTTI !
